DATA 4 - [MIL02] CAMPUS DI VITTUONE - PROGRAMMA GENERALE DELL'INTERVENTO
22/11/2024

DBA PRO.

FASE 0	**DEMOLIZIONI E BONIFICHE**		12+3M
	SCIA opere di Deomolizione e Bonifica Amianto	AREA A	
	Bonifica amianto e Demolizione edifici	AREA A	
	Approvazione Piano di Bonifica Terreni	AREA A	
	Bonifica terreni	AREA A	
	Certificazione avvenuta bonifica	AREA A	
	Sistemazione finale aree di scavo per fondazioni edifci	AREA A	
PA	**PIANO ATTUATIVO - AREA A**		20M
	ITER Piano Attuativo	AREA A + DC1	
	Approvazione Piano Attuativo	AREA A + DC1	
	Adozione Piano Attuativo	AREA A + DC1	
	Fima Notarile convenzione	AREA A + DC1	
FASE 1	**AUTORIZZAZIONI**		13M
	VIA - Valutazione di Impatto Ambientale	AREA A+B / DC1 + DC2	
	Progetto di Prevenzione Incendi in Deroga	AREA A + DC1	
	Parere Paesaggistico Preliminare	AREA A + DC1	
	SCIA alternativa al PDC	AREA A + DC1	
	CANTIERE PARTE NORD- DC1.1		14M
	Gara d'appalto	DC.1.1	
	Inizio lavori	DC.1.1	
	Opere strutturali e involucro	DC.1.1	
	Pre-costruzione impianti in container in fabbrica	DC.1.1	
	Montaggio container e realizzazione reti distributive interne	DC.1.1	
	Collaudi	DC.1.1	
	CANTIERE PARTE SUD - DC1.2		14M
	Opere strutturali e involucro	DC.1.2	
	Pre-costruzione impianti in container in fabbrica	DC.1.2	
	Montaggio container e realizzazione reti distributive interne	DC.1.2	
	Collaudi	DC.1.2	
	CONNESSIONE ALTA TENSIONE TERNA		37M
	2 - PTO Progetto Tecnico Operativo		8M
	3 - Richiesta autorizzazioni		4M
	4 - STMD		7M
	5 - Realizzazione nuova Sottostazione Terna e posa cavo alta tensione		20/24M
	6 - Collaudi e messa in servizio		2M
	CONNESSIONE MEDIA TENSIONE E-DISTRIBUZIONE 9,5MW	25M	25M
	Richiesta forniutura		1M
	Preventivo per allaccio (e-Distribuzione)		3M
	Accettazione Preventivo		3M
	Richiesta autorizzazione		15M
	Realizzazione Opere		3M
FASE 2	**PERMESSO DI COSTRIRE EX SUAP ART8/160 AREA B**		
	INIZIO ITER	AREA B + DC2	21M
	VAS - Valutazione Ambientale Strategica	AREA B + DC2	
	Verifica compatibilità PTCP/PTM/PTR	AREA B + DC2	
	Conferenza di Servizi Istruttoria	AREA B + DC2	
	Altri Permessi	AREA B + DC2	
	Progetto di Prevenzione Incendi in Deroga	AREA B + DC2	
	Rilascio Permesso di Costruire	AREA B + DC2	
	CANTIERE PARTE NORD- DC2.1		14M
	Gara d'appalto	DC.2.1	
	Inizio lavori	DC.2.1	
	Opere strutturali e involucro	DC.2.1	
	Pre-costruzione impianti in container in fabbrica	DC.2.1	
	Montaggio container e realizzazione reti distributive interne	DC.2.1	
	Collaudi	DC.2.1	
	CANTIERE PARTE SUD - DC2.2		14M
	Opere strutturali e involucro	DC.2.2	
	Pre-costruzione impianti in container in fabbrica	DC.2.2	
	Montaggio container e realizzazione reti distributive interne	DC.2.2	
	Collaudi	DC.2.2	

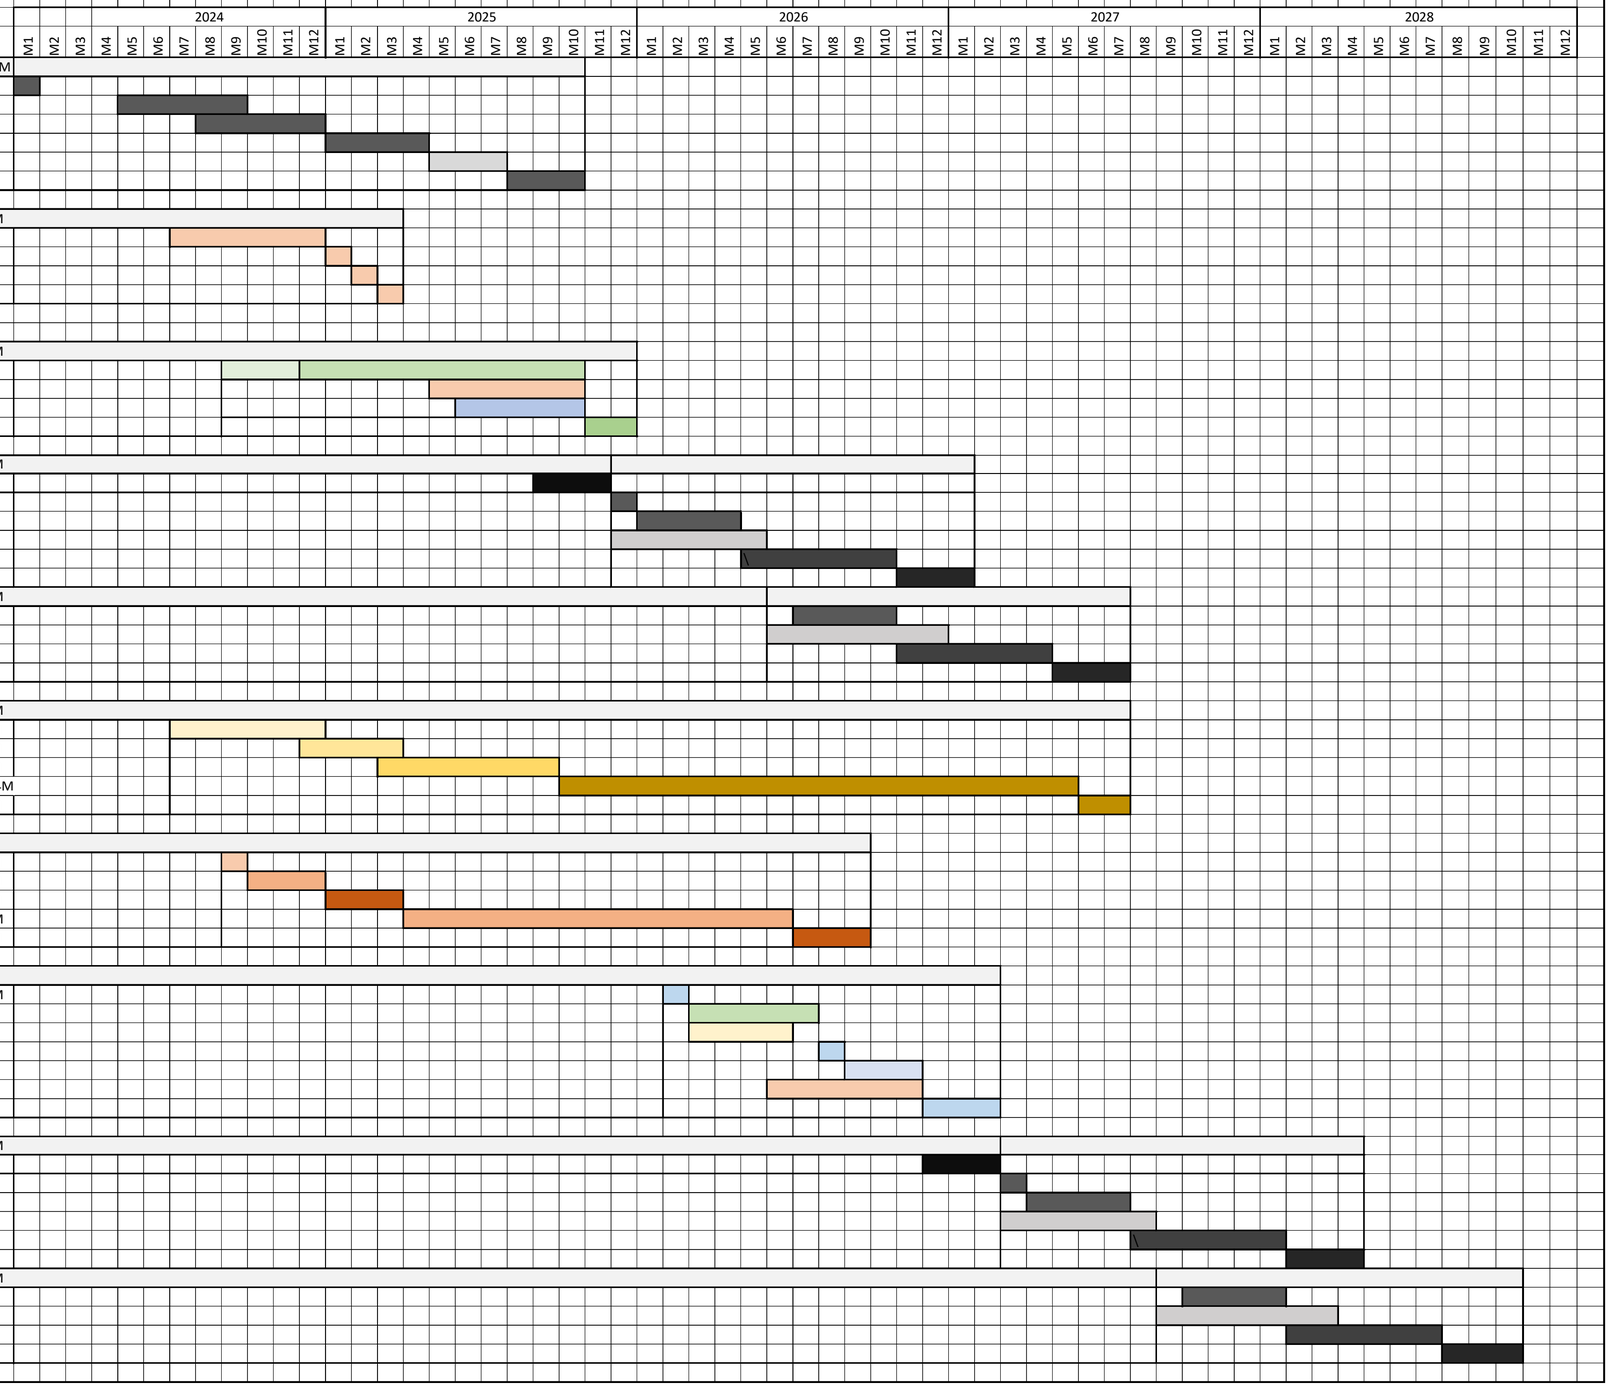

ORDINE DEGLI ARCHITETTI PIANIFICATORI PAESAGGISTI E CONSERVATORI DELLA PROVINCIA DI MONZA DANIELE DE BETTIN Sezione A/b - 4391

Daniele De Bettin Architetto
